

Smlouva o dílo

č. objednatele: 2025-022/SMRM

č. zhotovitele: 841/TB/FA/2025/002/FAAA

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Benátky nad Jizerou**
se sídlem: Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
zastoupený: PhDr. Karel Bendl, starosta města
IČ: 00237442
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 0483202319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Karel Bendl, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Kochman a Martin Ječný

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený/jednající: Dipl. Ing. Moritzem Freyborn, předseda představenstva
Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení: ČS a.s., č. ú. 112071233/030
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, v zastoupení dle plné moci
Tomáš Svoboda, technický vedoucí PJ, v zastoupení dle plné moci
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Tomáš Svoboda, hlavní stavbyvedoucí, VPJ
Jan Dušek, stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur: B. Němcové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: **Opravy Benátky 2025 – Dočasné parkovací plochy**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení díla: **30.1.2025**

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli:

Parkoviště ulice Tovární – do 3.2.2025

Odstranění sliničních obrub Na Burse a 5. května – do 3.2.2025

Parkoviště ulice 5. května - do 12.2.2025

Parkoviště ulice Na Burse – do 28.2.2025

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: Benátky nad Jizerou, ulice 5. května, Tovární, Na Burse – viz příloha č. 2 – Situace dočasných parkovišť

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 2.230.942,93 Kč bez daně z přidané hodnoty, tj. **2.699.440,95 Kč** s daní z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to na žádost objednatele, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno zhotovitelem a odsouhlaseno objednatelem. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, budou ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.4 Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41 - 43, není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, a proto se všech zdanitelných plnění uskutečněných na základě této smlouvy nebude týkat režim tzv. přenesené daňové povinnosti dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a stavební práce budou fakturovány s DPH.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.3) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 2 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelům způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelům adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl.

nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb).

- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

9. Provedení díla a přijímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přijímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přijímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Za toto dílo není sjednána záruční lhůta.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% celkové smluvní ceny.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% celkové smluvní ceny.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v elektronické podobě s platností originálu.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:
- Organizace spojených národů,
 - Federální vlády Spojených států amerických,
 - Evropské unie.
- Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.
- 12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:
[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)
- Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:
[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/\\$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf)
- 12.7 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Situace ploch dočasných parkovišť
- 12.8 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.9 Tato smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 5/R1/2025 dne 10.1.2025
Za správnost smlouvy odpovídá p. Martin Ječný
- 12.10 Správce rozpočtu města Benátky nad Jizerou souhlasí s uzavřením této smlouvy.

12.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Benátkách nad Jizerou dne

V Benátkách nad Jizerou dne

Objednatel: Město Benátky nad Jizerou

Zhotovitel: STRABAG a.s.

.....
PhDr. Karel Bendl, starosta města

.....
Ing. Luděk Pavlů
Vedoucí obchodně technického úseku
V zastoupení dle plné moci

.....
Tomáš Svoboda
Technický vedoucí PJ
V zastoupení dle plné moci

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Jana Hausera, nar. 15.1.1983, bytem Pražská 549, 251 64 Mnichovice – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Jozefa Krížka, nar. 05.12.1979, bytem Nová Vyhlička 504, 289 14 Poříčany – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Tomáše Svobodu, nar. 30.03.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Marka Reže, nar. 03.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Eduarda Macha, nar. 15.02.1961, bytem Prasek 141, 504 01 Nový Bydžov – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Václava Foltýna, nar. 03.11.1988, bytem Bořanovická 367, 250 65 Líbeznice – technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Petra Ballka, nar. 21. 11. 1974 bytem, Toužimská 660/77, 197 00 Praha 9 - Kbely – technického vedoucího oblasti (dále jen „TBL“)

Ing. Petru Kroupovou, nar. 25. 9. 1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomickou vedoucí oblasti (dále jen „KBL“)

Ing. Ludka Pavlů, nar. 24. 8. 1978, bytem Dobřichov 309, 289 11 Pečky – vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „BR-OTÚ“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne **25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;

- TBL společně s KBL

nebo

- TBL nebo KBL společně s příslušným TGL nebo BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2025.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG a.s.

Dipl. Ing.
Moritz
Freyborn

Digitálně podepsal Dipl.
Ing. Moritz Freyborn
Datum: 2024.12.19
16:54:22 +01'00'

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva

Ing. Tomáš
Hoza

Podepsal Ing. Tomáš Hoza
DN: cn=Ing. Tomáš Hoza, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=2122,
email=tomas.hoza@strabag.com
Datum: 2025.01.08 08:26:22
+01'00'

Ing. Tomáš Hoza
člen představenstva

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Benátky opravy 2025

Objednatel: Město Benátky nad Jizerou Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.1.		Parkovací plocha Na Burse (960 m2)				
1.1.1.		Sejmutí ornice tl vrstvy 200 mm strojně	m2	960,000	98,50	94.560,00
1.1.2.		Vodorovné přemístění ornice do 50 m	m3	192,000	184,00	35.328,00
1.1.3.		Uprava nivelety podloží	m2	960,000	371,40	356.544,00
1.1.4.		Uprava pláně se zhutněním strojně	m2	960,000	24,50	23.520,00
1.1.5.		Geotextilie netkaná pro separaci 400g/m2, dodávka a montáž	m2	960,000	149,00	143.040,00
1.1.6.		PDK 0/22 MN tl. do 20 cm - dodání, pokládka	m2	960,000	232,00	222.720,00
1.1.7.		Dočasné zajištění staveniště	kpl	1,000	79.320,00	79.320,00
1.1.	Celkem	Parkovací plocha Na Burse (960 m2)				955.032,00
1.2.		Parkovací plocha 5. května (670 m2)				
1.2.1.		Sejmutí ornice tl vrstvy 200 mm strojně	m2	670,000	98,50	65.995,00
1.2.2.		Vodorovné přemístění ornice do 50 m	m3	134,000	184,00	24.656,00
1.2.3.		Uprava nivelety podloží	m2	670,000	371,40	248.838,00
1.2.4.		Uprava pláně se zhutněním strojně	m2	670,000	24,50	16.415,00
1.2.5.		Geotextilie netkaná pro separaci 400g/m2, dodávka a montáž	m2	670,000	149,00	99.830,00
1.2.6.		PDK 0/22 MN tl. do 20 cm - dodání, pokládka	m2	670,000	232,00	155.440,00
1.2.7.		Dočasné zajištění staveniště	kpl	1,000	54.500,00	54.500,00
1.2.	Celkem	Parkovací plocha 5. května (670 m2)				665.674,00
1.3.		Parkovací plocha Tovární (382 m2)				
1.3.1.		Sejmutí ornice tl vrstvy 200 mm strojně	m2	382,000	98,50	37.627,00
1.3.2.		Vodorovné přemístění ornice do 50 m	m3	76,400	184,00	14.057,60
1.3.3.		Uprava nivelety podloží	m2	382,000	371,40	141.874,80
1.3.4.		Uprava pláně se zhutněním strojně	m2	382,000	24,50	9.359,00
1.3.5.		Geotextilie netkaná pro separaci 400g/m2, dodávka a montáž	m2	382,000	149,00	56.918,00
1.3.6.		PDK 0/22 MN tl. do 20 cm - dodání, pokládka	m2	382,000	232,00	88.624,00
1.3.7.		Dočasné zajištění staveniště	kpl	1,000	31.100,00	31.100,00
1.3.	Celkem	Parkovací plocha Tovární (382 m2)				379.560,40
1.4.		Odstanění silničních obrub				
1.4.1.		Výrthání obrub silničních včetně odvozu na deponii a předrcení	m	50,000	482,40	24.120,00
1.4.2.		Dobetonování pásu výrthaných obrub	m3	7,500	6.320,40	47.403,00
1.4.3.		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 R9 tl. 60 mm na pás výrthaných obrub	m2	25,000	672,30	16.807,50
1.4.	Celkem	Odstanění silničních obrub				88.330,50
1.5.		Vedlejší rozpočtové náklady				
1.5.1.		Inženýrská a kompletační činnost	kpl	1,000	40.153,13	40.153,13
1.5.2.		Vytýčení a ochrana inženýrských sítí v zájmové lokalitě	kpl	1,000	12.523,64	12.523,64
1.5.3.		Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby, zaměření stavby odpovědným geodetem	kpl	1,000	25.047,28	25.047,28
1.5.4.		Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, dotčených komunikací	kpl	1,000	27.051,06	27.051,06
1.5.5.		Dopravné inženýrská opatření-zřízení, údržba odstraňování	kpl	1,000	37.570,92	37.570,92
1.5.	Celkem	Vedlejší rozpočtové náklady				142.346,03
1.5.	Celkem	Benátky opravy 2025				2.230.942,93




STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(272)

20-12-2024


5. Května 670 m²

Termín: 12.2.2025

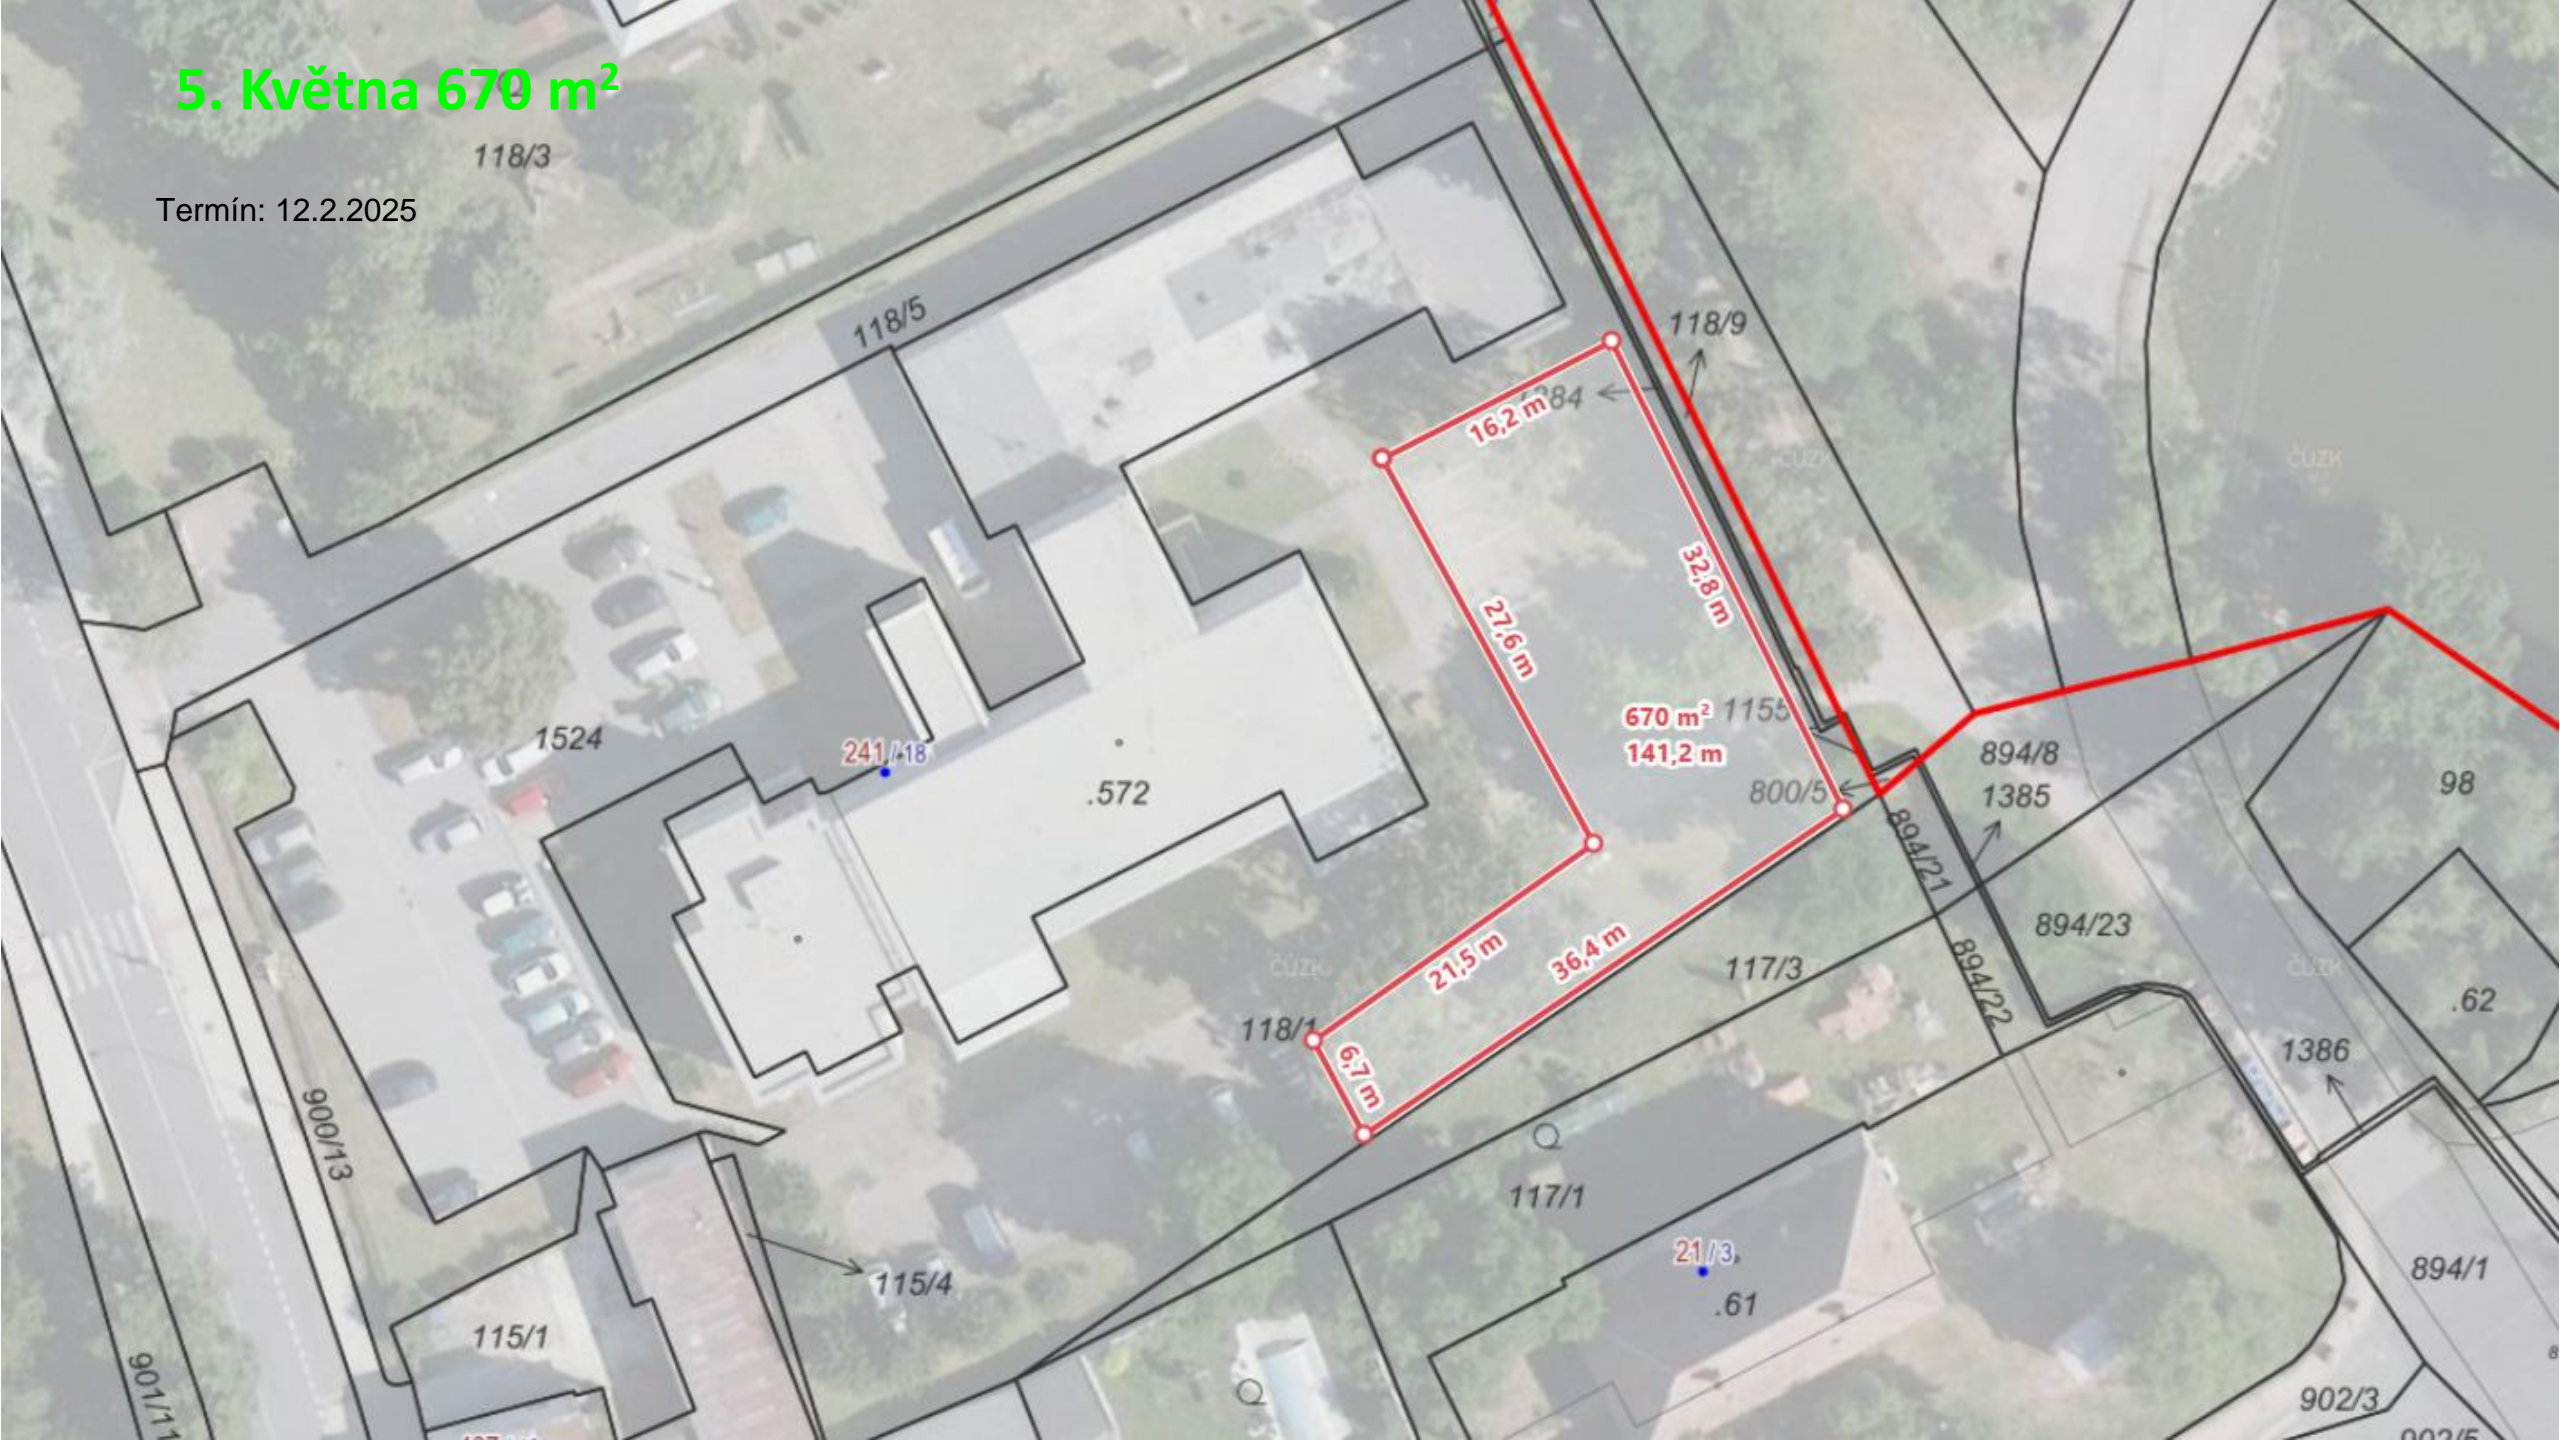

Tovární 382 m²

Termín: 3.2.2025 včetně úprav silničních obrub na Burse a 5. května

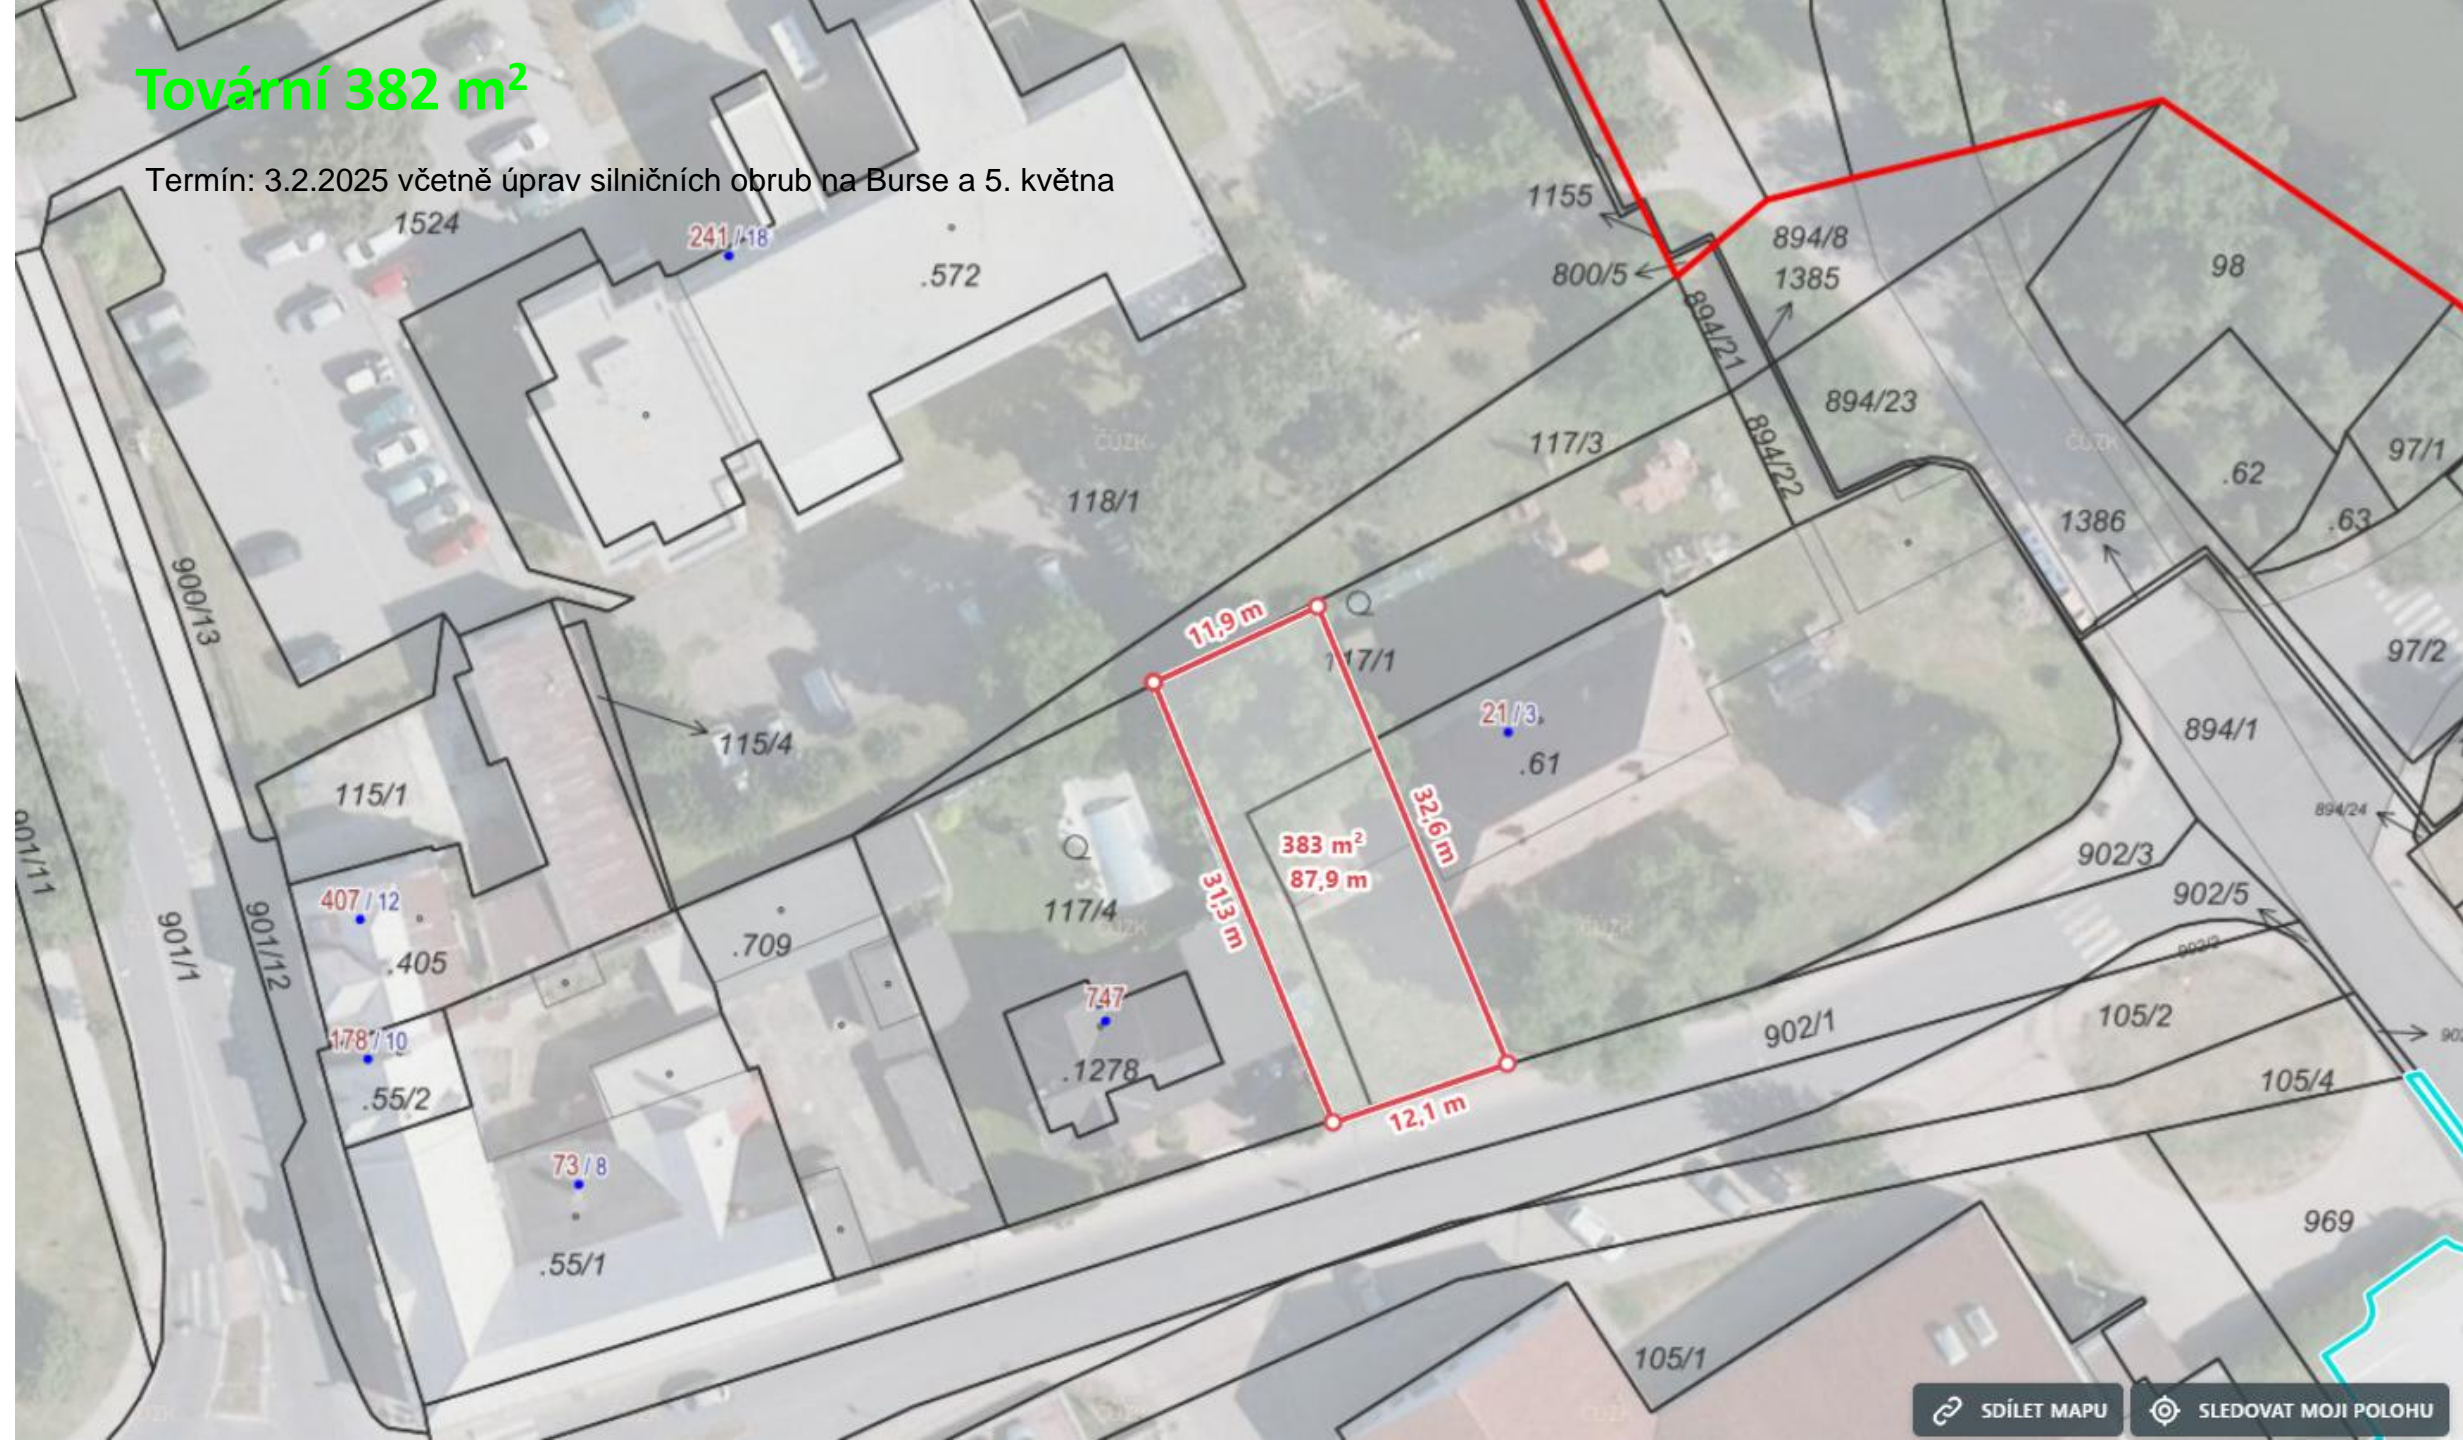

Na Burse 960 m²

Termín: 28.2.2025

